
quitt – Projekt-Roadmap

10.11.2026 – 10.02.2027 · 3 Personen · 3 Arbeitstage pro Woche à 7 Stunden · Feiertagspause 24.12. – 04.01.

Zeitplan

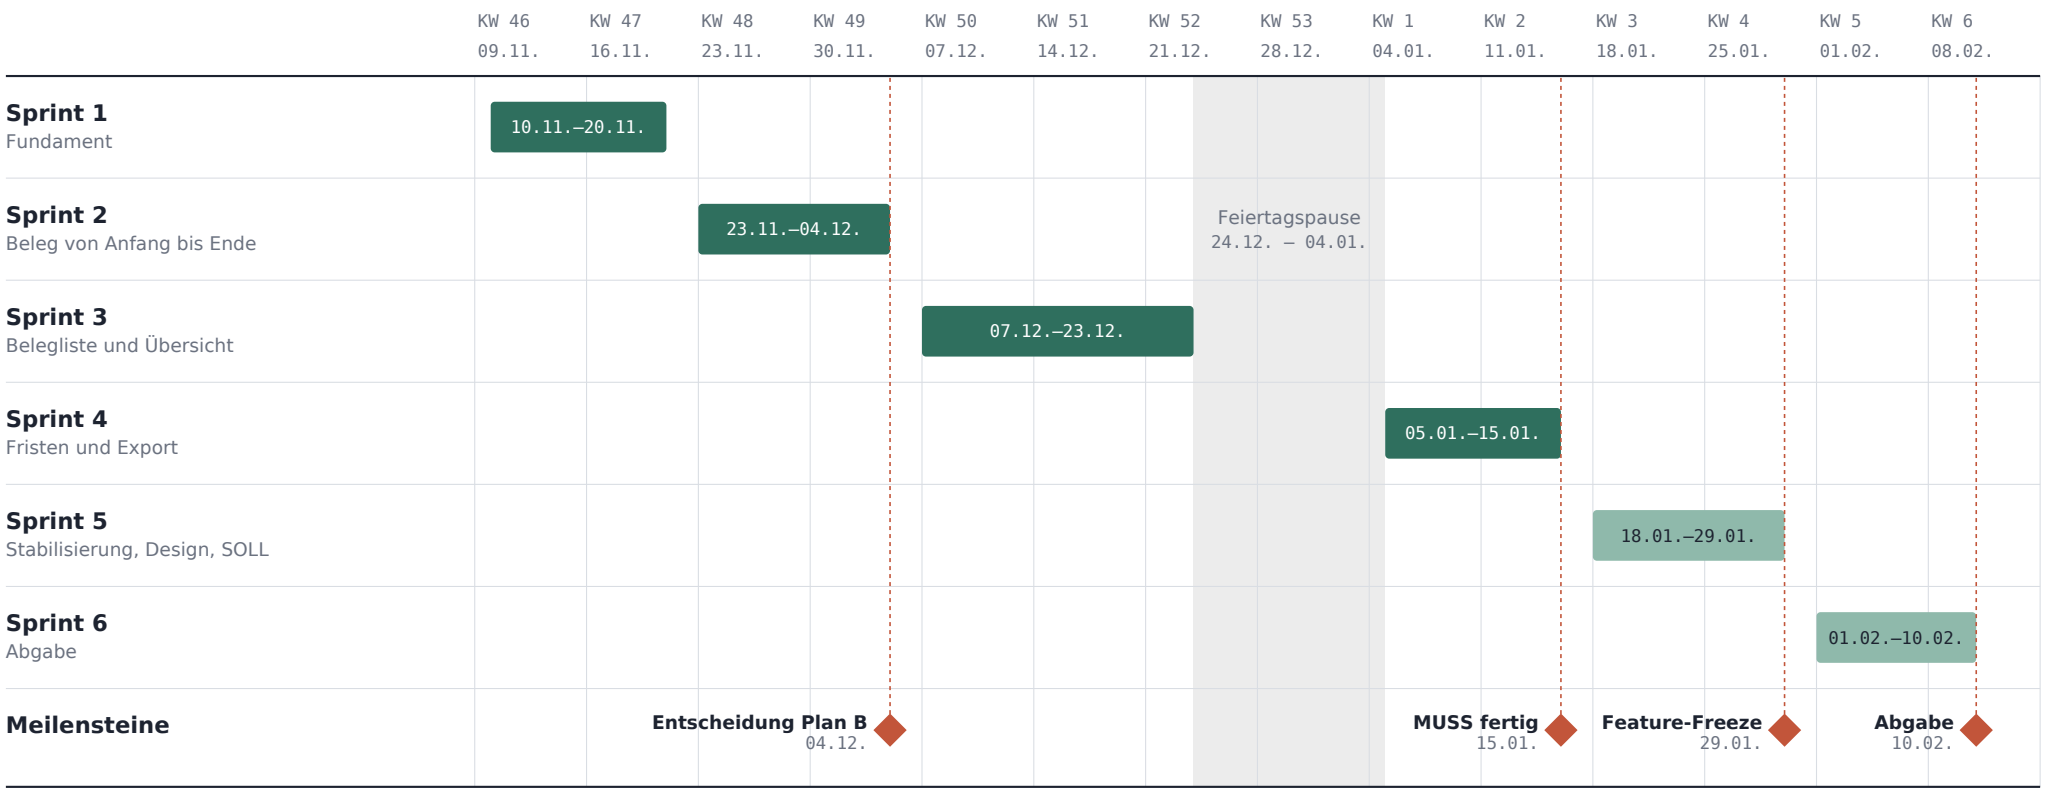

MUSS (Sprint 1–4): Onboarding mit Hinweis, Beleg scannen und speichern, Betrag / Datum / Kategorie, Filter und Suche, Erinnerungen für Fristen, PDF-Export.
SOLL (Sprint 5): Fahrten-Schnellerfassung, Dark Mode. Nur falls Zeit bleibt: OCR, Google-Login.
Plan B (Entscheidung am 04.12.): Web-App mit React + Vite, falls Kamera und Foto-Upload auf den Geräten nicht stabil laufen. Das Backend bleibt gleich.

Aufgaben pro Sprint

Rollen: A = App (React Native + Expo) · B = API (FastAPI) · C = Datenbank, Docker, Dokumentation

Sprint	Zeitraum	Ziel	A · App	B · API	C · DB, Docker, Doku	Ergebnis
1	10.11. – 20.11.	**Fundament**	• Expo-Projekt • Tab-Navigation • Login / Registrierung • Onboarding mit Hinweis	• FastAPI mit `/health` • Registrierung und Login mit JWT	• Docker Compose • User-Modell mit Migrationen • README „How to start“	Login vom Handy gegen das Backend in Docker
2	23.11. – 04.12.	**Beleg von Anfang bis Ende**	• Kamera / Fotoauswahl • Formular: Betrag, Datum, Kategorie, Notiz • Beleg speichern • Einfache Liste	• CRUD `/entries` mit JWT • Foto-Upload	• Entry-Modell mit `kind` • Migration • Docker-Volume für Fotos	Beleg fotografieren, speichern und in der Liste sehen
3	07.12. – 23.12.	**Belegliste und Übersicht**	• Liste nach Monaten • Suche, Filter, Jahresauswahl • Badge „Foto fehlt“ • Beleg bearbeiten / löschen • Startseite mit Summen	• Filter in der API • Summen pro Kategorie • PDF-Export (ReportLab)	• Testdaten (Seed) • API-Tests in der CI	Suchen, filtern, Summen sehen; PDF kommt aus der API
–	24.12. – 04.01.	Feiertagspause				
4	05.01. – 15.01.	**Fristen und Export**	• Fristen-Screen • Lokale Erinnerungen (6 Wochen / 1 Woche, monatlicher Belege-Check) • ELSTER-Link • Jahresübersicht mit PDF-Export	• PDF-Feinschliff mit Hinweis • Fehlerbehandlung	• Unterstützung beim PDF • Doku aktualisieren	**MUSS fertig**
5	18.01. – 29.01.	**Stabilisierung, Design, SOLL**	• Design anwenden • Leere Zustände, Fehlermeldungen • Fahrten-Schnellerfassung • Dark Mode	• Bugfixes • API für Strecken (`kind = trip`)	• Tests • Bugfixes	Feature-Freeze am 29.01.
6	01.02. – 10.02.	**Abgabe**	• Tests auf echten Geräten • Fixes	• Fixes • Demo-Daten	• README und Doku • Decision Log	Präsentation und Abgabe
